

8月17日（金）

額縁の設置完了
（最上階より高良山を臨む）



8月17日（金）

タイルの試し貼り
（写真右下の金物は、タイルをワイヤーで壁に固定する為のもの。接着剤、金物、額縁により3重の落下防止対策が施されている）



8月18日（土）

タイルの取付け
（写真は納品されたタイルと回生の対応リスト。関係者全員が同じ資料をたずさえ、見落としや順番の間違いがないよう入念にチェック）



8月18日（土）

ワイヤーを壁の下地に固定し、タイルは額縁の溝へけんどん状に挿入して固定




8月18日（土）

取付けたタイル位置や目地巾が上下に揃っているかを確認中



8月18日（土）

2～3階の一部まで終了

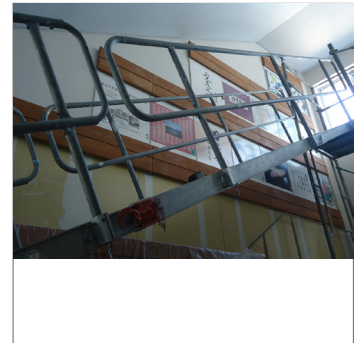

8月20日（月）

3～4階の取付け
（額縁の高さ不足のため一部調整が必要となり、タイル工事は完了は翌日に持越し）



8月20日（月）

最上階の取付け終了



8月20日（月）

タイルのない空欄には同じ大きさ、厚みのボードを壁色に塗装し仮固定しておく（今後61回生以降のパネルが出来次第、ビスを外して取替えていく計画）




8月20日（月）

階段手摺を額縁と色合せ



8月20日（月）

額縁と並行して設置の進む卒業記念品のアート
左 58 回生：野見山暁治 作
右 61 回生：片伯部平 作
（青色部は養生）



8月20日（月）

附設新校舎の竣工も間近

